Оптимизация процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Выполнили студентки 28 гр.:
Герасимова К.А., Катышева Е.Е., Леонтьева С.А.





Команда эффективности

Лидер команды:



Герасимова Ксения Анатольевна, студентка 28 гр.

Члены команды:



Катышева Екатерина Евгеньевна, студентка 28 гр.



Леонтьева София Александровна, студентка 28 гр.

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Лидер команды
Герасимова Ксения Анатольевна, студентка 28 гр.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Архипенкова Анастасия Артуровна
Владелец процесса: Тучин Виктор Михайлович
Периметр проекта: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
Границы процесса: от формирования студентом папки по практическим работам до выполнения практических работ
Руководитель проекта:
Герасимова Ксения Анатольевна, студентка 28 гр.
Команда проекта:
Герасимова Ксения Анатольевна, студентка 28 гр.;
Катышева Екатерина Евгеньевна, студентка 28 гр.;
Леонтьева София Александровна, студентка 28 гр.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение студентом полного объема образовательной программы
Последствия:
- снижение успеваемости и оценок студентов;
- появление долгов по практическим работам

Причины возникновения: отсутствие финансово и физической возможности оформления папки по практической работе
Ценность для заказчика: реализация данного проекта позволит:
- снизить объём используемой бумаги;
- сократить финансовые затраты на печать;
- сократить время подготовки студентов к практическим работам во время пары.

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время, потраченное на подготовку к практической работе во время пары	15 минут	До 5 минут
Финансовые затраты на печать необходимых листов группы на одну дисциплину	3400 рублей	400 рублей
Финансовые затраты на полное оформление папки группой на одну дисциплину	4150 рублей	1550 рублей

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта 14 февраля 2025 г.)
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (14 февраля – 21 марта 2025 г.)
-**разработка карты текущего состояния процесса** – диапазон времени (21 февраля 2025г.);
-**разработка карты целевого состояния процесса** – диапазон времени (28 февраля 2025.)
-**разработка плана реализации проекта** – диапазон времени (07 марта — 21 марта 2025 г.)
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (21–28 марта 2025 г.)
4. Внедрение улучшений – диапазон времени (28 марта – 11 апреля 2025 г.)
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (11 апреля – 25 апреля 2025 г.)
6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени (16 мая 2025 г.)

Члены команды:
Герасимова Ксения Анатольевна, студентка 28 гр.;
Катышева Екатерина Евгеньевна, студентка 28 гр.;
Леонтьева София Александровна, студентка 28 гр.


Карта текущего состояния процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

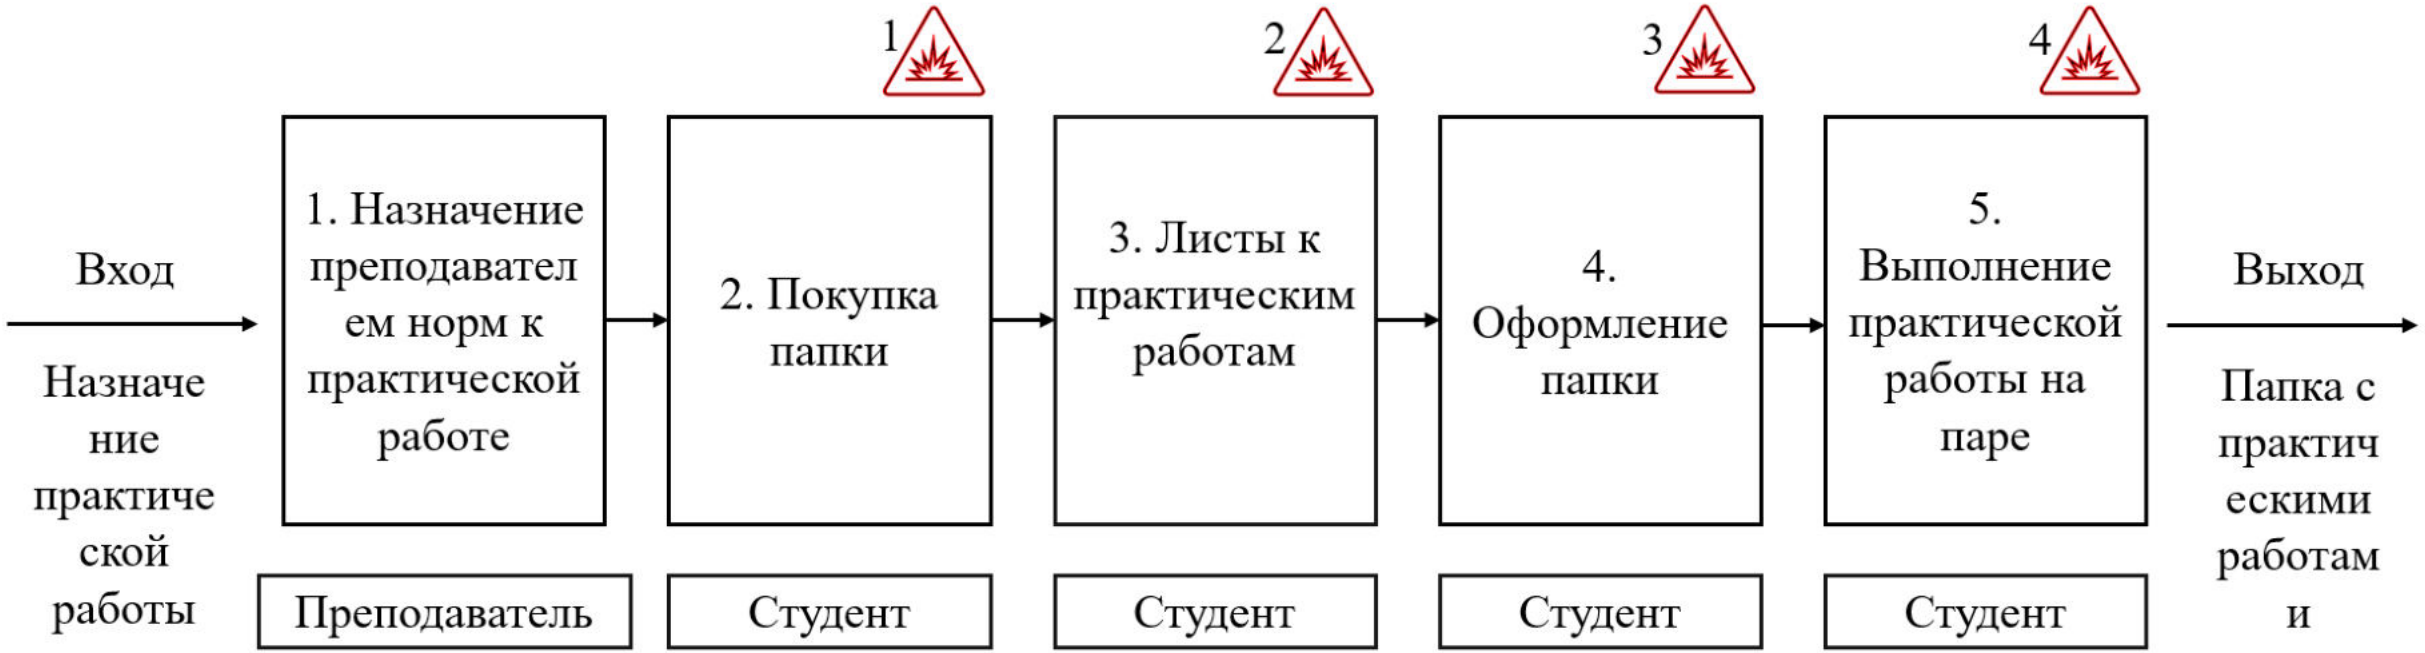

Проблемы:

1. Неответственность студентов.
2. Отсутствие финансов.
3. Незнание.
4. Отсутствие папки и листов для выполнения практических работ; трата времени на паре.

Карта целевого состояния процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

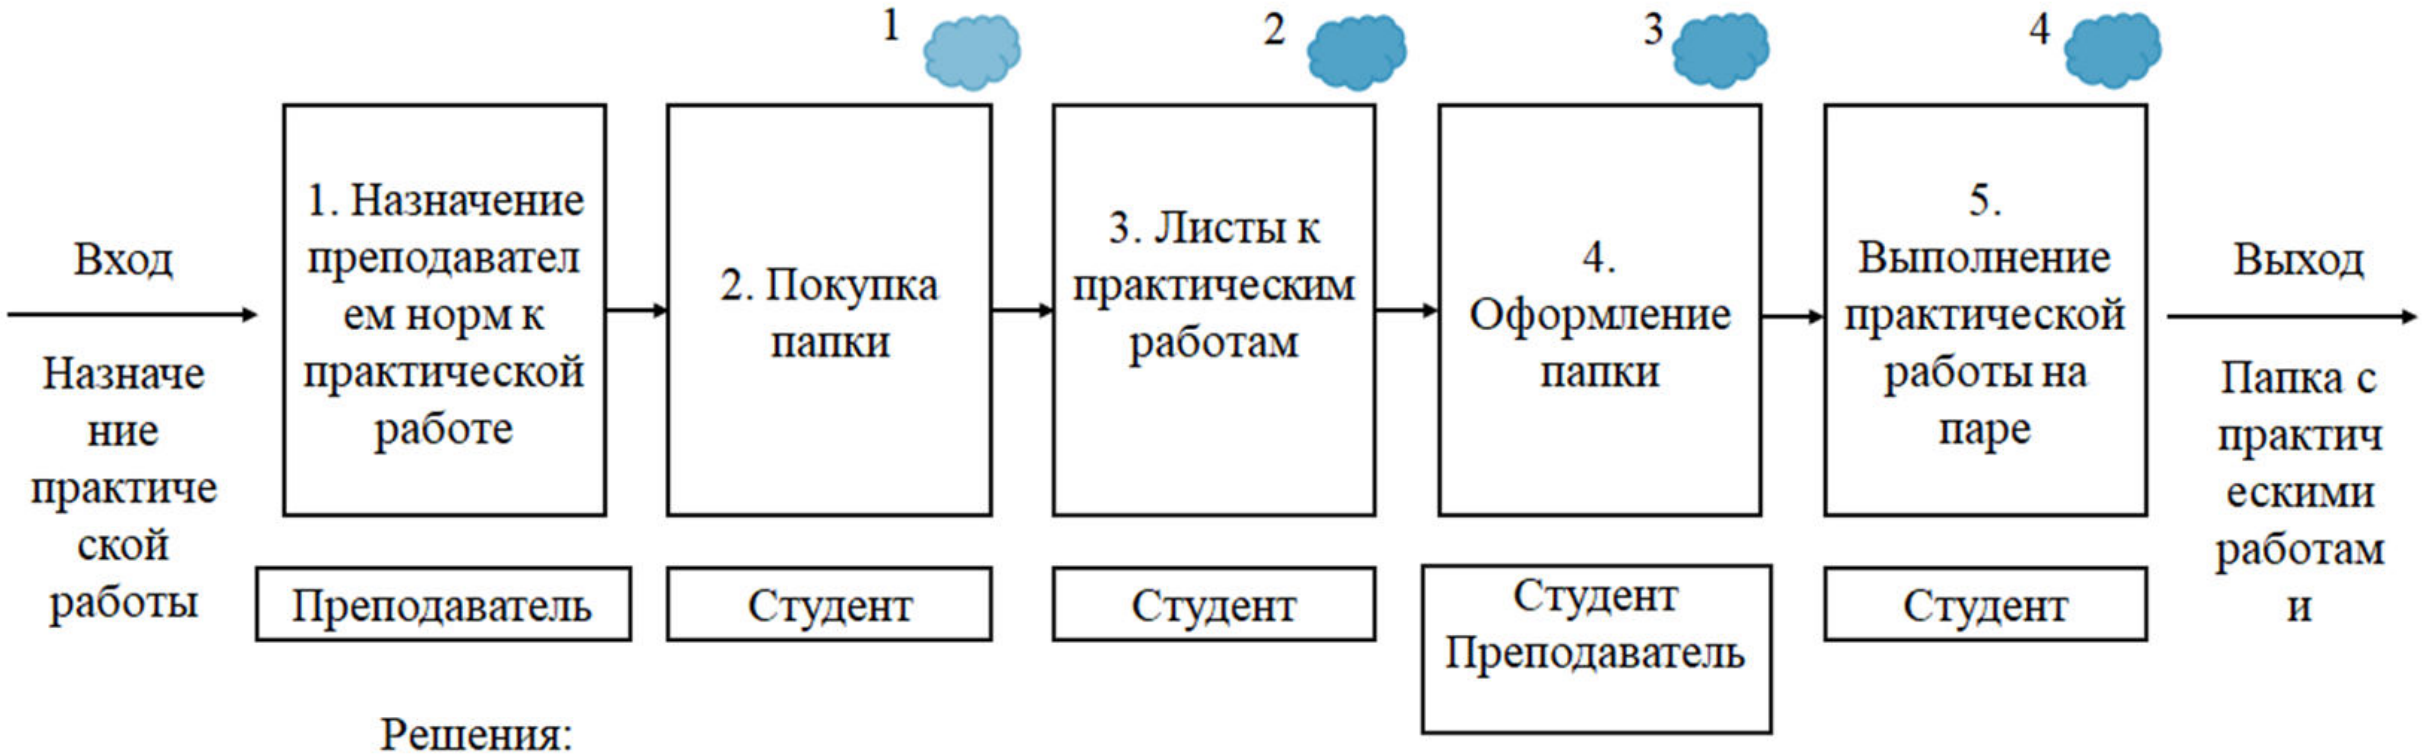

Решения:

1. Покупка одним человеком на всех
2. Необходимого количества листов для всех практических; отказ от специальных листов с рамкой, для не технических специальностей
3. Оформление папки вместе с преподавателем по его требованиям
4. Решив проблемы 1,2 и 3 не возникает проблема 4

План мероприятий по реализации проекта « Оптимизации процесс подготовки студентов к практическим работам»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Не ответственность студентов	1	Покупка одним человеком на всех	Староста 28 гр. Шатрова А.	С 1 сентября по 15 сентября	Наличие у всех студентов 28гр. одинаковых папок
2	Отсутствие финансов	2	Необходимого количества листов для всех практических; отказ от специальных листов с рамкой, для не технических специальностей	Староста 28 гр. Шатрова А. Председатель ПЦК экологических дисциплин	С 1.09 – 15.09	Сокращение финансовых затрат и времени
3	Незнание требований к оформлению папки	3	Оформление папки вместе с преподавателем по его требованиям	Архипенкова А.А.	С 15.09 – 22.09	Папка оформленная по требованиям
4	Отсутствие папки и листов для выполнения практической работы; трата времени на паре	4	Решив проблемы 1,2 и 3 не возникает проблема 4			Снижение затрат времени на паре при проведении практических работ

Члены команды
Леонтьева С.А./_____
Катышева Е.Е./_____
Герасимова К.А./_____


Алгоритм процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»



До оптимизации процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Дисциплина	Группа	Количество оформленных папок	Количество не оформленных папок	Фото
Менеджмент	24	8	14	
Менеджмент	27	20	4	
Налоги и налогообложение	28	19	6	
Экономика	24	16	6	
Основы бережливого производства	29Э	15	10	

Результат после оптимизации процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

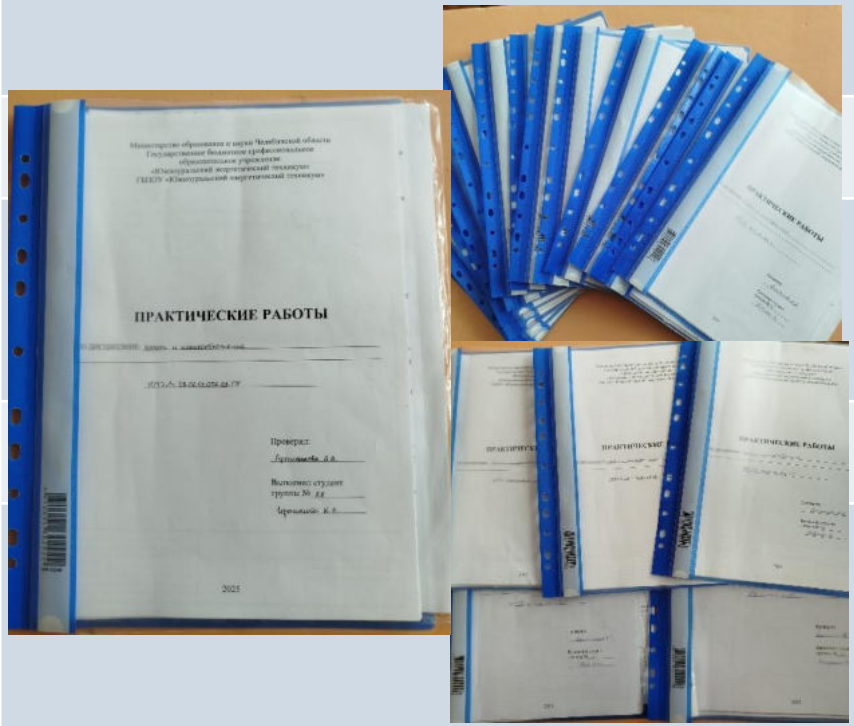Дисциплина	Группа	Количество оформленных папок	Количество не оформленных папок	Фото
Менеджмент	24	22	0	
Менеджмент	27	24	0	
Налоги и налогообложение	28	25	0	
Экономика	24	22	0	
Основы бережливого производства	29Э	25	0	

Оптимизация процесса подготовки студентов к практическим работам в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Выполнили студентки 28 гр.:
Герасимова К.А., Катышева Е.Е., Леонтьева С.А.



